Tema 3.2: GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO













Áreas de conocimiento en la gestión de proyectos

- Gestión de la Integración del Proyecto
- **GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO**
- Gestión del Tiempo del Proyecto
- Gestión de los Costes del Proyecto
- Gestión de la Calidad del Proyecto
- Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto
- Gestión de las Comunicaciones
- Gestión de los Interesados
- Gestión de los Riesgos del Proyecto
- Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

La gestión del alcance incluye:

TRABAJOS NECESARIOS PARA COMPLETAR EL PROYECTO



SÓLO LOS TRABAJOS NECESARIOS

OBJETIVO → **DEFINIR** / **CONTROLAR** → **QUÉ SE INCLUYE Y QUÉ NO EN EL PROYECTO**

GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

La gestión del alcance incluye:

RECOPILAR REQUISITOS



DESGLOSAR TRABAJO



ASEGURAR EL CUMPLIMENTO DE ENTREGABLES



El término alcance puede referirse a:

ALCANCE DEL PRODUCTO








ALCANCE DEL PROYECTO

Gestión del alcance:

1. RECOPILAR REQUISITOS
2. DEFINIR EL ALCANCE
3. CREAR LA EDT/WBS
4. VERIFICAR EL ALCANCE
5. CONTROLAR EL ALCANCE

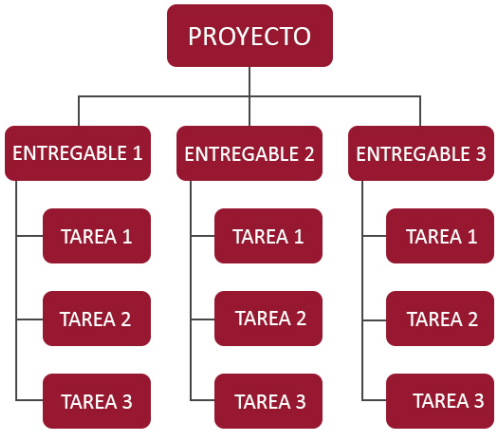





GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Gestión del alcance:

1. RECOPILAR REQUISITOS
2. DEFINIR EL ALCANCE
3. CREAR LA EDT/WBS
4. VERIFICAR EL ALCANCE
5. CONTROLAR EL ALCANCE





Acta de Constitución del Proyecto
Registro de Interesados

RECOPILAR REQUISITOS
Entrevistas
Grupos de opinión
Técnicas grupales
etc

Documentación de Requisitos
Plan de Gestión de Requisitos
Matriz de trazabilidad de Requisitos








GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Gestión del alcance:



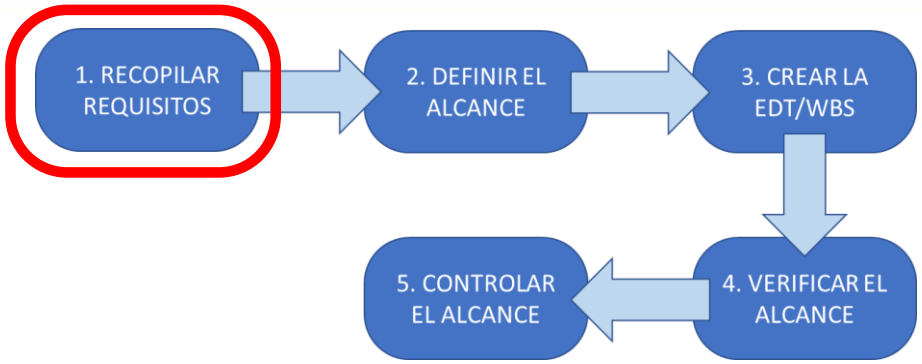


Matriz de rastreabilidad de requisitos

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS								
Nombre del proyecto								
Fecha de preparación								
INFORMACIÓN DE REQUISITOS					RELACIÓN DE TRAZABILIDAD			
ID.	REQUISITO	PRIORIDAD	CATEGORÍA	FUENTE	OBJETIVO	WBS ENTREGABLE	MÉTRICA	VALIDACIÓN


Gestión del alcance:



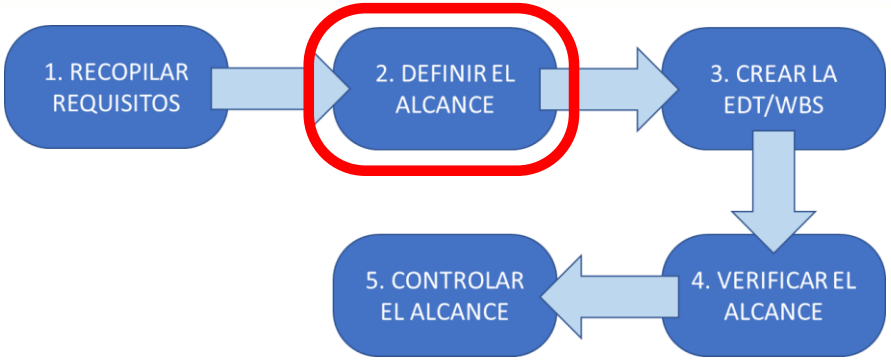



REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO Y DEL PRODUCTO

La preparación de una declaración detallada del alcance del proyecto es fundamental para su éxito, y se elabora a partir de los entregables principales, los supuestos y las restricciones que se documentan durante el inicio del proyecto.




Gestión del alcance:

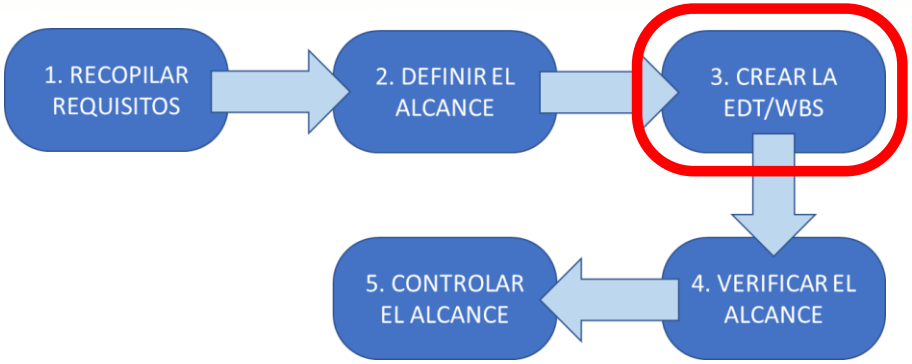


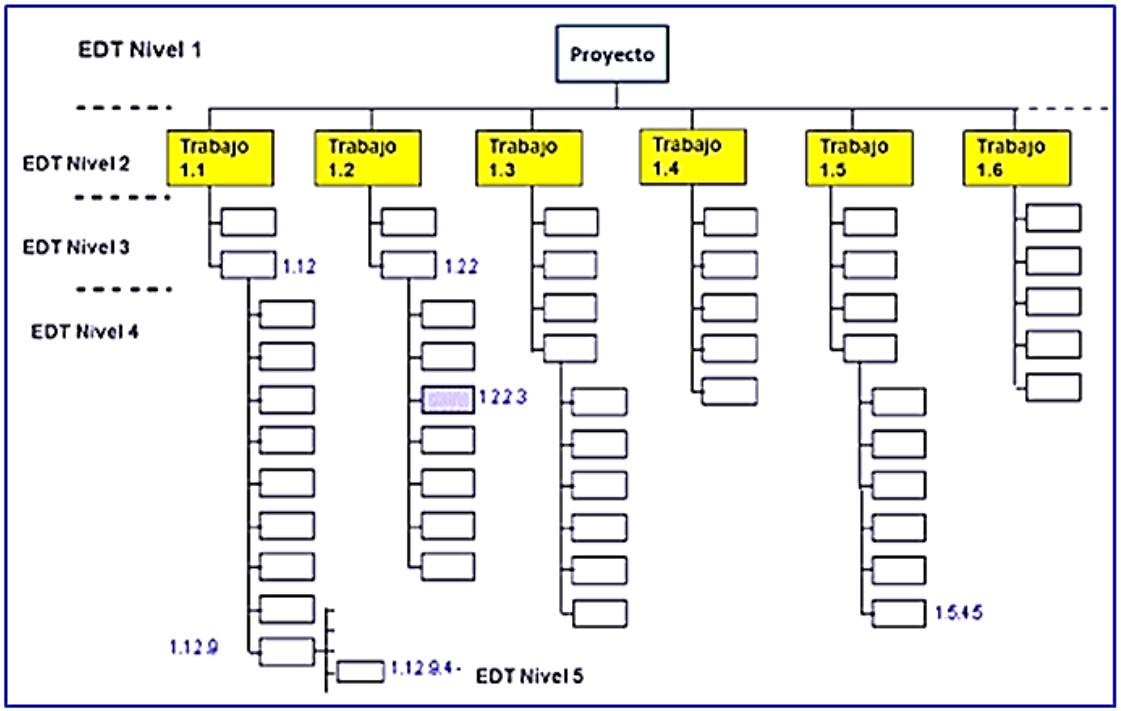

Subdivisión del trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar.

Gestión del alcance:

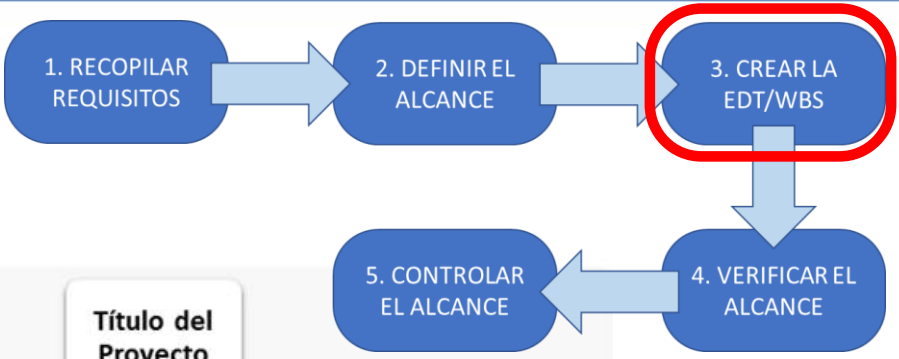

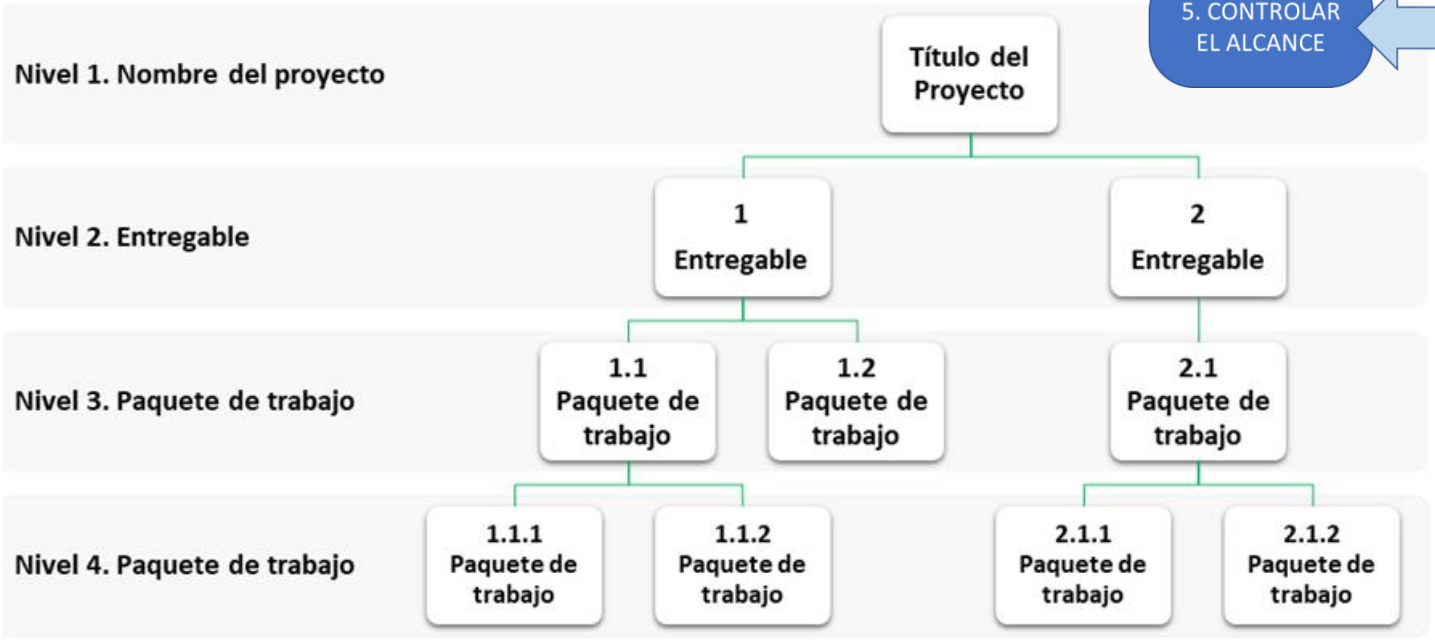


EDT

La estructura de desglose del trabajo (EDT) es una descomposición jerárquica, basada en los entregables del trabajo que debe ejecutar el equipo del proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos, con cada nivel descendente de la EDT representando una definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto.

EDT / WBS

Diccionario de la EDT

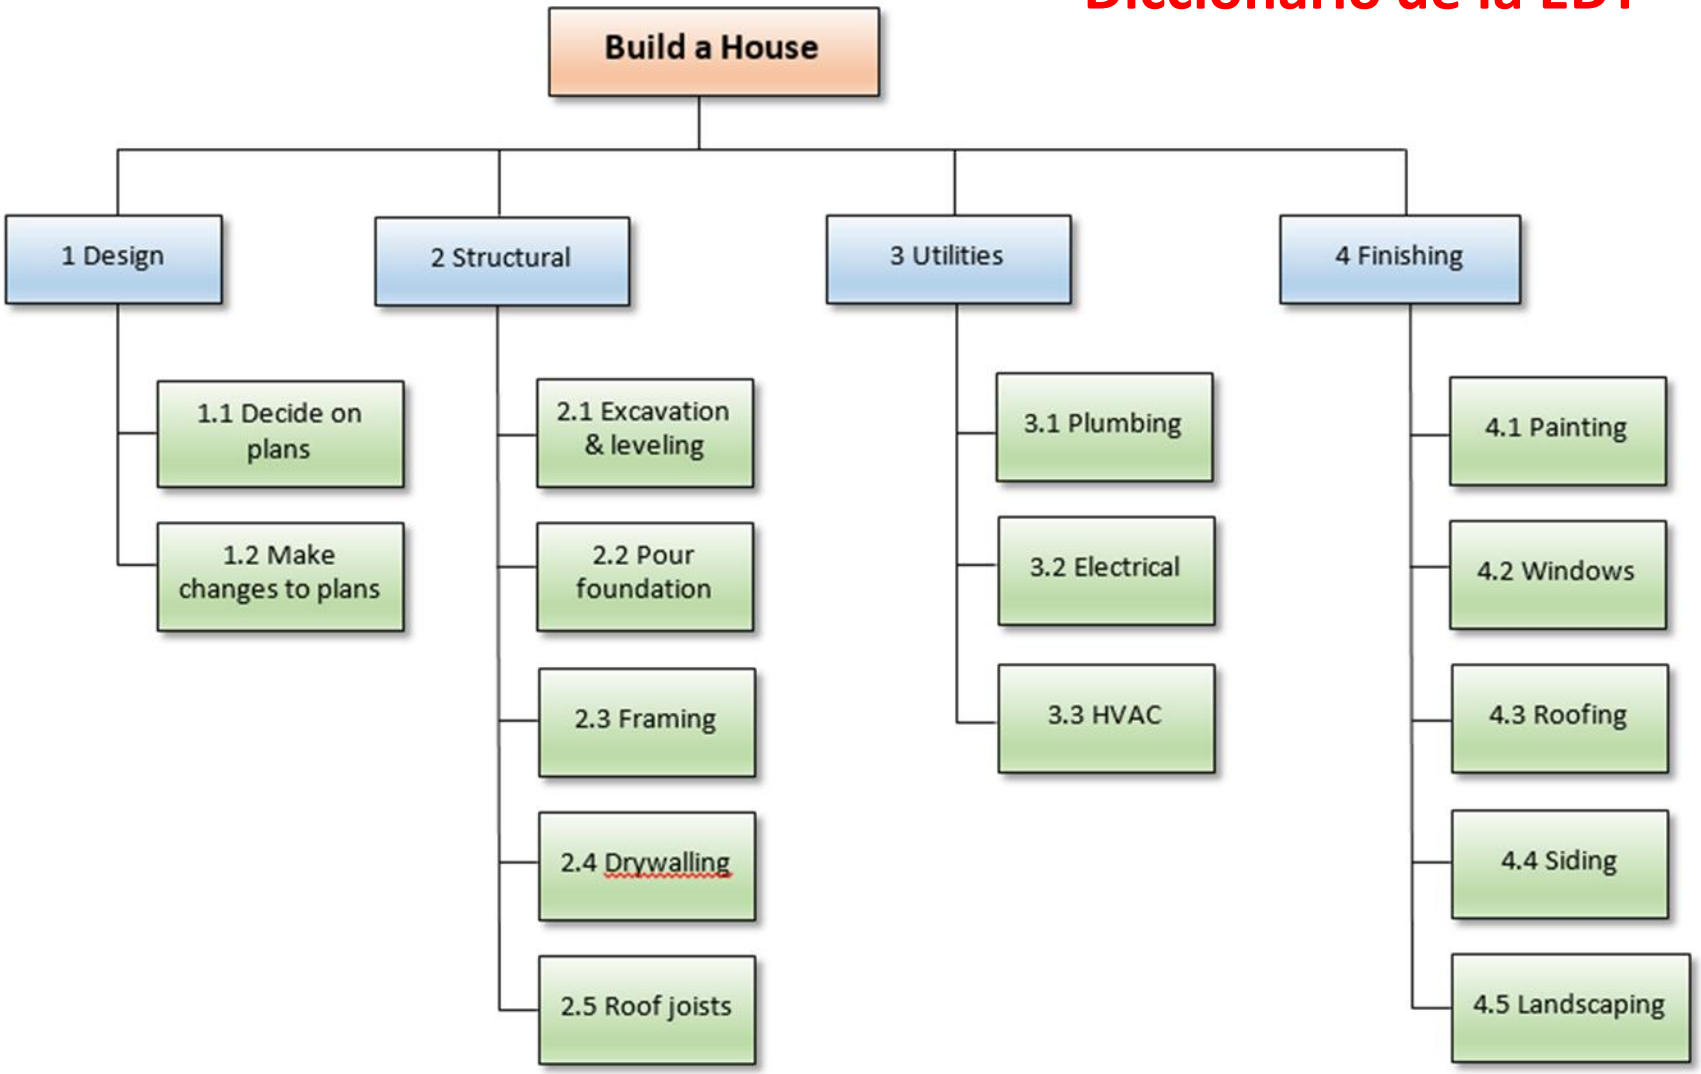


























EDT / WBS

Id.	objetivos	descripción	responsable	hitos	Coste estimado	Tiempo de ejecución


EDT / WBS

Proyecto: carril bici entre Castellón y La Pobla d'Alcolea

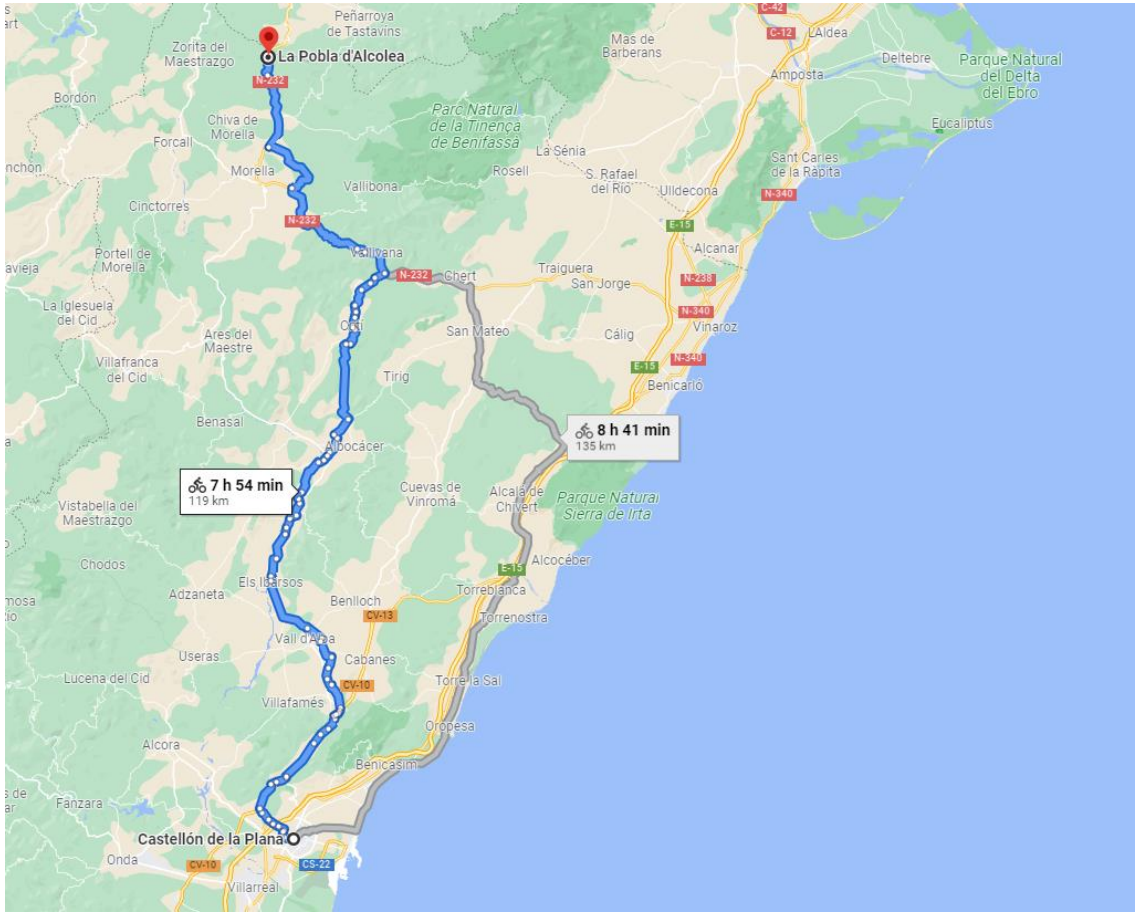


GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Gestión del alcance:





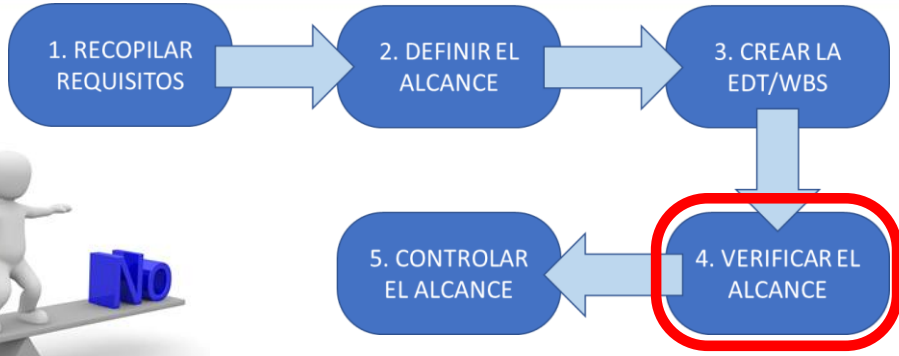

FORMALIZAR LA ACEPTACIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO QUE SE HAN COMPLETADO


REVISAR LOS ENTREGABLES CON EL CLIENTE O EL PATROCINADOR

La verificación del alcance se diferencia del control de calidad en que mientras la primera corresponde principalmente a la **aceptación de los entregables**, el segundo se refiere sobre todo a corroborar la exactitud de los entregables y su cumplimiento con los requisitos de calidad especificados para los entregable

GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Gestión del alcance:



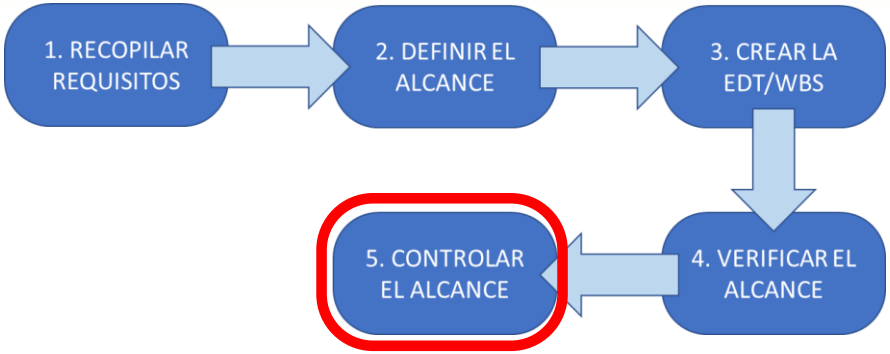

MONITOREAR EL ESTADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO Y DEL PRODUCTO, Y GESTIONAR CAMBIOS A LA LÍNEA BASE DEL ALCANCE



