
Tema 3.1: GESTIÓN DE LOS INTERESADOS EN EL PROYECTO



AulaFacil.com

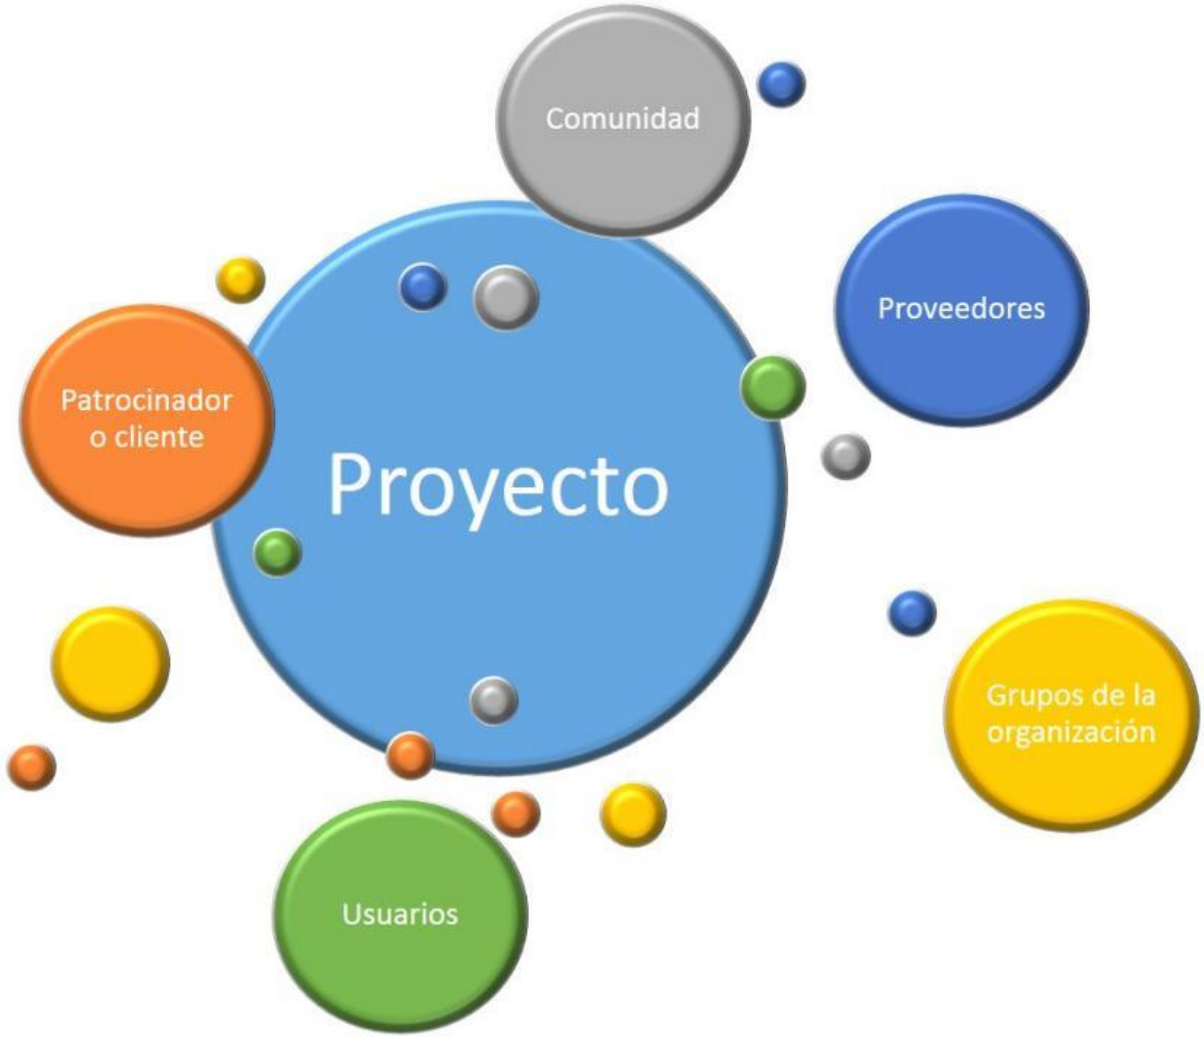


Áreas de conocimiento en la gestión de proyectos

- Gestión de la Integración del Proyecto
- Gestión del Alcance del Proyecto
- Gestión del Tiempo del Proyecto
- Gestión de los Costes del Proyecto
- Gestión de la Calidad del Proyecto
- Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto
- Gestión de las Comunicaciones
- **GESTIÓN DE LOS INTERESADOS**
- Gestión de los Riesgos del Proyecto
- Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

GESTIÓN DE INTERESADOS DEL PROYECTO

Identificar a…



PERSONAS



GRUPOS



ORGANIZACIONES



ENTIDADES

…que van a verse afectadas por el proyecto

GESTIÓN DE INTERESADOS DEL PROYECTO

PERSONAS

GRUPOS

ORGANIZACIONES

ENTIDADES

Analizar expectativas



Fomentar participación



Analizar el impacto



¿Qué son los interesados/stakeholders?

Fase de proyecto
Fase de ejecución
Fase de explotación
Fase de abandono



¿Qué son los interesados/stakeholders?

A FAVOR DEL PROYECTO

EN CONTRA DEL PROYECTO

TENER RESPONSABILIDADES EN EL PROYECTO



APOYAR

CONFRONTAR

BLOQUEAR



Interesados habituales

ENTIDADES MUNICIPALES O GUBERNAMENTALES

Autorizaciones
Sanciones
Licencias
Normas urbanísticas



SPONSOR
PATROCINADOR
PROMOTOR

Debe informarse

Satisfacer

Éxito del proyecto



PROVEEDORES

Seleccionar

Quieren ganar clientes



Interesados habituales

EMPLEADOS
EQUIPO DE TRABAJO

Participan

Esperan recursos



CLIENTE

Usuario final

Satisfacer

Expectativas



OTROS

Vecinos
Asociaciones
Comercios
Bancos
Etc.









Impacto en el proyecto




LIBERAR O RETENER DINERO Y RECURSOS





INTERCEDER PARA CONSEGUIR O RETENER RECURSOS




AGILIZAR O RETRASAR COMPRAS/EQUIPOS



Impacto en el proyecto



FACILITAR O ENTORPECER NEGOCIACIONES



COLABORACIÓN: EXPERIENCIA, CONTACTOS, ETC.



RESPONSABILIDAD EN ALGUNOS ASPECTOS



Impacto en el proyecto



ERRORES O DEMORAS EN LA ENTREGA DE MATERIAL



MOVILIZACIONES SOCIALES



ETC.

Estrategias en la gestión de interesados

REUNIONES

- PERSONAS
- GRUPOS
- ORGANIZACIONES
- ENTIDADES

INFORMAR

INVOLUCRAR



INTENTAR SATISFACER SUS EXPECTATIVAS



CONFIRMACIÓN DE NECESIDADES Y CONDICIONES POR ESCRITO





Estrategias en la gestión de interesados



COMUNICACIÓN DE INDICADORES DE PROGRESO DEL PROYECTO



INFORMACIÓN DEL BENEFICIO DEL PROYECTO A LA COMUNIDAD



NEGOCIACIÓN DE MEDIDAS COMPENSATORIAS

Pasos a seguir en la gestión de interesados

MATRIZ DE ANÁLISIS DE INTERESADOS

IDENTIFICAR LOS INTERESADOS

ANALIZAR SUS EXPECTATIVAS E IMPACTO EN EL PROYECTO

ESTABLECER ESTRATEGIAS A SEGUIR CON ELLOS

COMPROMISO CON ELLOS

TOMA DE DECISIONES



ÉXITO DEL PROYECTO



Matriz de análisis de interesados

PARA CADA UNO DE LOS INTERESADOS

ANALIZAR NIVEL DE INTERÉS

Preocupaciones

Inconvenientes

Beneficios




ANALIZAR NIVEL DE PODER O AUTORIDAD

En las distintas fases del proyecto



Matriz de análisis de interesados

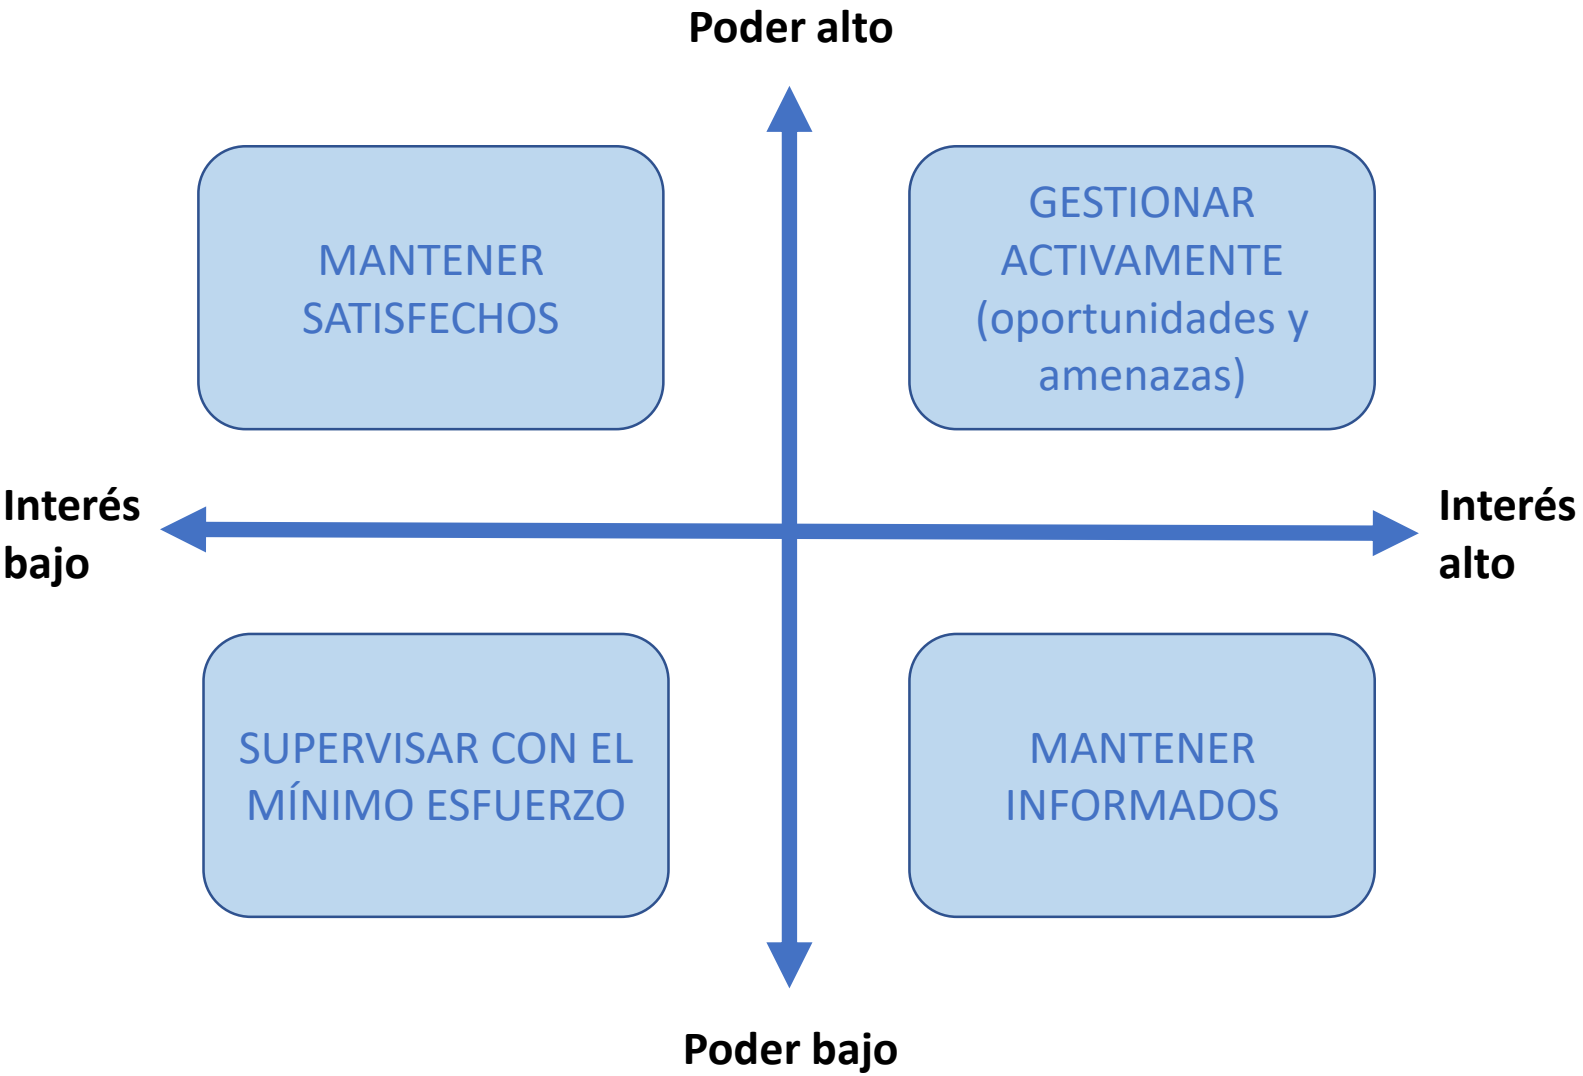

Ejemplo: PROYECTO DE PUENTE SOBRE EL RÍU SEC



Ejemplo: PROYECTO DE PUENTE SOBRE EL RÍU SEC



Ejemplo: PROYECTO DE PUENTE SOBRE EL RÍU SEC

1. IDENTIFICAR LOS INTERESADOS

MÉTODOS PARA IDENTIFICARLOS → TORMENTA DE IDEAS | REUNIÓN GRUPO FOCAL | ENTREVISTAS CON EXPERTOS

- Técnicos del proyecto
- Técnicos del ayuntamiento
- Agencia europea EDUSI infraestructuras sostenibilidad
- Vecinos de las zonas a conectar
- Concejales y alcaldesa

Ejemplo: NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍU SEC

1. IDENTIFICAR LOS INTERESADOS

EJEMPLO 1



NOMBRE	Alcaldesa y concejales
ETAPAS DEL PROYECTO EN LAS QUE INFLUYE	Inicio, Planeación, Ejecución, Monitoreo y Cierre
TIPO DE INTERÉS	Ejecución de nuevas infraestructuras en la ciudad. Interés político
POTENCIAL DE IMPACTO	Financian el Proyecto y verifican si el resultado es satisfactorio.
NIVEL DE INTERÉS	Alto
PODER	Alto

Ejemplo: NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍU SEC

1. IDENTIFICAR LOS INTERESADOS

EJEMPLO 2

NOMBRE	Agencia europea EDUSI
ETAPAS DEL PROYECTO EN LAS QUE INFLUYE	Inicio, Planeación, Ejecución, Monitoreo y Cierre
TIPO DE INTERÉS	Ejecución de infraestructuras para fomenter la sostenibilidad
POTENCIAL DE IMPACTO	Financian el Proyecto asignando dinero al ayuntamiento. Pueden solicitar indicadores de mejora de la sostenibilidad
NIVEL DE INTERÉS	Alto
PODER	Alto

Ejemplo: NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍU SEC

1. IDENTIFICAR LOS INTERESADOS


EJEMPLO 2



Ejemplo: NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍU SEC

1. IDENTIFICAR LOS INTERESADOS

EJEMPLO 3



NOMBRE	Asociación de vecinos Crémor
ETAPAS DEL PROYECTO EN LAS QUE INFLUYE	Inicio y Planeación
TIPO DE INTERÉS	Necesitan la conexión para alumnos instituto secundaria y para dinamizar comercios
POTENCIAL DE IMPACTO	Campañas a favor
NIVEL DE INTERÉS	Alto
PODER	Bajo

Ejemplo: NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍU SEC

1. IDENTIFICAR LOS INTERESADOS

EJEMPLO 4

NOMBRE	Asociación de vecinos Raval Universitari
ETAPAS DEL PROYECTO EN LAS QUE INFLUYE	Inicio y Planeación
TIPO DE INTERÉS	Necesitan la conexión. Pero son contrarios al tráfico rodado. Asocian tráfico a pérdida de calidad de vida (accidentes, contaminación atmosférica y acústica)
POTENCIAL DE IMPACTO	Campañas informatives en contra: firmas, etc.
NIVEL DE INTERÉS	Alto
PODER	Bajo

Ejemplo: NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍU SEC

1. IDENTIFICAR LOS INTERESADOS

EJEMPLO 5



NOMBRE	TÉCNICOS DEL PROYECTO
ETAPAS DEL PROYECTO EN LAS QUE INFLUYE	Inicio, Planeación, Ejecución, monitoreo y Cierre
TIPO DE INTERÉS	Realizar bien el trabajo para estabilidad y reconocimiento
POTENCIAL DE IMPACTO	Responsables de la ejecución del mismo
NIVEL DE INTERÉS	Alto
PODER	Bajo













Ejemplo: NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍU SEC

1. IDENTIFICAR LOS INTERESADOS

EJERCICIO DE CLASE

- Identificar **los interesados** de un proyecto.
  - Partiréis de los interesados que habéis dicho en el acta de constitución de cada uno
  - Revisaréis si falta algún interesado
- Rellenar el registro de los interesados
- Utilizar la matriz de análisis de interesados para elegir la estrategia a establecer
- Podéis añadir tantas filas como necesitéis
